


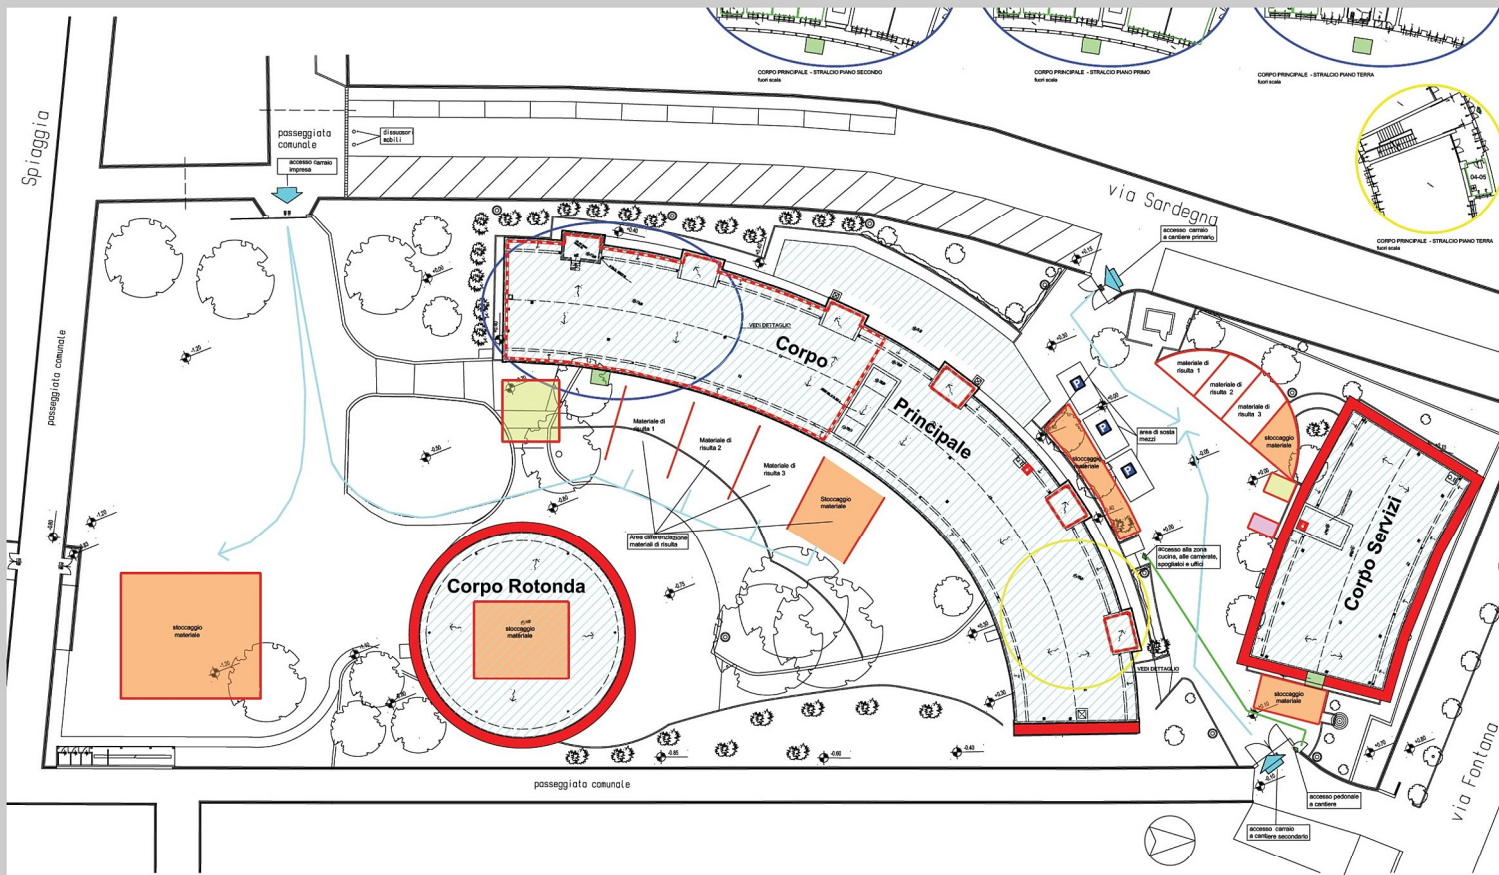

Complessivamente il sistema per la gestione della sicurezza nel cantiere è stato positivo.

Durante l'esecuzione dei lavori, durati più di due anni, non si sono verificati eventi dannosi infortunistici nemmeno di lieve entità.

L'impresa ha eseguito le disposizioni impartite dal CSE.

Durante ogni sopralluogo veniva rilevata la tipologia delle lavorazioni in corso; veniva individuato il luogo all'interno del cantiere in cui la lavorazione stava avvenendo ed infine il numero dei lavoratori e la ditta di appartenenza. Completato questo quadro conoscitivo venivano impartite le indicazioni di coordinamento per le diverse lavorazioni al fine di evitare i rischi interferenziali.

Le maggiori fonti di rischio per il cantiere sono state quelle dovute alla caduta dall'alto (durante il rifacimento delle coperture ed il posizionamento dei pannelli solari) e di seppellimento durante la esecuzione della fossa dell'impianto ascensore e del posizionamento dei disoleatori per la cucina.



